MODULO 5 RENTAS

Cierre tecnico y preparacion de entrega

Estado verificado al 5 de noviembre de 2026 | Repositorio Modulo-5

NO-GO PARA RELEASE, MERGE FINAL O TAG

Resumen. La candidata tiene CI funcional, estabilidad, pruebas no funcionales y PIT global exitosos en el SHA de codigo indicado. Esto no cierra la entrega: el PR sigue Draft, quedan 51 tareas Jira abiertas, cuatro CVE de 2026 sin decision formal de Seguridad, la inspeccion de sobrevivientes PIT no termino y no existe evidencia de procesamiento durable por Ciudadanos M1. No se promovio a main ni se creo el tag.

Elemento	Estado remoto verificado
Rama candidata	codex/m5-final-close-20261103
SHA validado	f7143c5b537d766d70acce1403ec6ff1f7f654c6
PR #104	OPEN / Draft / CLEAN hacia develop
develop	a3827528f24434d872504c8f14604ad7b6ae3a10
main	c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b
Tag v1.0-testing	No existe; no creado

Bloqueos que determinan el NO-GO

Integracion: falta la revision y merge autorizado del PR #104; PR #107 a #110 tambien permanecen abiertos y algunos contienen trabajo de la candidata o dependencias de revision.

Seguridad: CVE-2026-47890, 47884, 47834 y 47860 siguen sin correccion ni aceptacion documentada por Seguridad.

Calidad: mutation score pasa 60%, pero el triage de 146 mutantes sobrevivientes y 92 sin cobertura sigue abierto; el artefacto PIT no incluye CSV.

Jira: 147/198 Finalizadas; 8 Under Review y 43 Tareas por hacer. No se forzaron transiciones masivas.


Release: no hay autorizacion de DevOps para promocionar develop a main; el login Core/JWT de produccion y la recepcion durable M1 no se validaron.

1. Validacion tecnica y evidencia

Las verificaciones siguientes corresponden al mismo SHA de codigo f7143c5. El CI ordinario del PR #104 y los workflows manuales de estabilidad y no funcionales terminaron SUCCESS en ese SHA.

Prueba	Resultado	Evidencia
Backend Java 17	874 tests; 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos. PostgreSQL Testcontainers 17.11, RabbitMQ 4.3 y Flyway V31 PASS.	CI PR #104
JaCoCo global	Lineas 92,65%; instrucciones 90,64%; ramas 73,37%.	backend/target/site/jacoco; artefacto de CI
Cobertura dominio	14 familias / 19 classfiles (incluye internas). Lineas 470/477 = 98,53%; ramas 608/824 = 73,79%; gate 80/70 PASS.	coverage.csv + summary.txt
Frontend	410/410 tests, 57 archivos; lineas 88,25%; build PASS; npm audit sin vulnerabilidades.	CI PR #104
Playwright / API	E2E 30/30; Schemathesis 6542/6542; cinco perfiles DEMO comprobados.	Artifact Playwright y Schemathesis del CI
Aceptacion Python / PDF / bulk	27/27 tests; escenarios bulk 10, 50 y 200; PDFs sinteticos generados.	CI PR #104
Estabilidad	3 de 3 corridas completas PASS sobre el mismo SHA.	Workflow 41983049050
k6 / ZAP	50 VUs; 44.142 requests; 44.139/44.139 checks; 0% requests fallidos; p95 global 9,88 ms. ZAP: 0 High, 3 Medium, 4 Low, 2 Info.	Workflow 41983717483
CI / Sonar / SCA / secretos / Terraform	Todos los checks del PR #104 SUCCESS; Terraform fmt/validate sin apply.	CI PR #104

Captura de evidencia sintetica

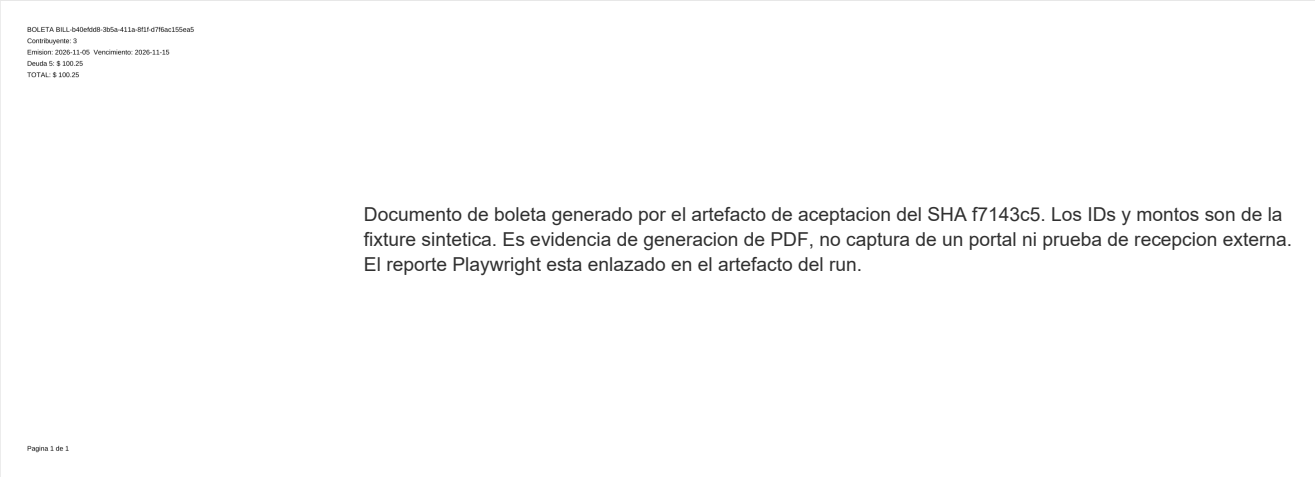

2. PIT y cobertura de mutaciones

PIT global en Java 17 / PIT 1.18.2, exact SHA f7143c5. Run 41977086708 termino SUCCESS en aproximadamente 50 min 33 s.

Resultado	Cantidad	Lectura
Mutantes generados	1.075	14 clases objetivo mutadas.
KILLED	837	Mutation Coverage = 78%; supera threshold 60%.
SURVIVED	146	Requiere triage; no todos se declaran relevantes ni inocuos.
NO_COVERAGE	92	Rutas mutadas sin cobertura por las pruebas seleccionadas.
Estados invalidantes	0	TIMED_OUT, MEMORY_ERROR, RUN_ERROR, NOT_STARTED.
Tests examinados	524	2.842 tests disponibles en ejecucion; 465/472 lineas mutadas cubiertas.

Alcance: la cobertura de dominio se mide sobre 14 familias y 19 classfiles incluyendo clases internas. PIT usa los 14 patrones de clase configurados y produjo mutantes en 14 clases objetivo. Son perimetros y denominadores diferentes; este informe no afirma que PIT mutó 19 classfiles. El gate de Jira SCRUM-807 pide score global de dominio >=60%, que esta corrida cumple, pero la inspeccion de sobrevivientes queda pendiente.

Artefactos: HTML y XML completos disponibles en el run. No se produjo CSV; por eso no se informa ese formato como entregado.

Sobrevivientes por clase con mayor cantidad

Clase objetivo	SURVIVED	Clase objetivo	SURVIVED
PlanWorkflowService	53	ReversalService	17
DueDateProcessor	12	AdjustmentService	10
ExemptionService	10	LiquidationRunService	10
PaymentService	8	ElectronicPaymentService	6
LiquidationService	6	BillingService	5
CreditBalanceService	4	LateChargeService	4
PaymentPlanPrincipalLedger	1	Otros	0

Jira: SCRUM-807 permanece Under Review hasta que se complete el analisis de sobrevivientes y no cobertura. El nuevo test de fecha fiscal elimina el mutante que quitaba requireNotFuture en DueDateProcessor.

3. GitHub, Jira e integracion

PR	Estado verificado	Nota
#104	OPEN / Draft / CLEAN, base develop	Candidata de cierre; CI exacto 41976414904 SUCCESS.
#100, #101, #86	MERGED	Merge SHAs f03eee1, ffc9038 y c2dabd8.
#107	OPEN / Ready / CLEAN	Rate limit de login; requiere revisar proxy CIDR antes de despliegue.
#108	OPEN / Draft / UNSTABLE	409 estados; ADR-0008/revision de CI pendiente.
#109	OPEN / Ready / BLOCKED	Problem Details; no se trata como listo a partir de evidencia antigua.
#110	OPEN / Ready / CLEAN	Fecha fiscal frontend; revisar contenido solapado al integrar.
#93	OPEN / Draft	DevOps ECS DEV; preservado.
#70, #71, #73, #75, #67, #68	OPEN / Drafts apilados	No cerrar ni borrar ramas: commits unicos no reconciliados completamente.
#78, #81, #83, #96	CLOSED sin merge	#96 parcialmente sustituido por #100; contenido exclusivo de otros PR requiere cuidado.

Jira de Santiago - consulta paginada actual

Estado	Cantidad	Detalle
Finalizada	147	Estado almacenado en Jira; no equivale a revalidar ahora todos los criterios historicos.
Under Review	8	626, 785, 788, 790, 807, 808, 809, 820.
Tareas por hacer	43	Lista al pie de esta seccion.
Total asignadas	198	JQL project = SCRUM AND assignee = currentUser().

To Do: 624, 683-685, 688-690, 697-699, 703-705, 709-710, 716-717, 720, 727, 729-731, 735-737, 740-742, 759, 766, 769, 771-778, 784, 792-793, 810-811.

No se cerraron tareas por la sola existencia de cambios. SCRUM-793 sigue pendiente de Seguridad; SCRUM-624 requiere aprobacion de ADR-0004; SCRUM-626 espera validacion de procesamiento/contrato M8; otras tareas dependen de identidad, Core, QA o aprobacion de responsables.

4. Seguridad y contratos externos

Dependencias y CVE

Advisory	Situacion verificada	Decision pendiente
CVE-2026-47890	Spring WebMVC 6.2.19 afectado; Spring: Low; OSV/GHSA snapshot: Critical. No se hallo ruta SSE con fragmentos de vista en el codigo revisado.	Aceptacion formal del residual o actualizacion compatible; auditar entorno/proxy.
CVE-2026-47884	Spring WebMVC 6.2.19 afectado; Spring: Medium; OSV/GHSA: Critical. No se hallo XsltView/ViewResolver/ModelAndView.	Aceptacion formal o upgrade. Los /** de seguridad no son MVC catch-all.
CVE-2026-47834	Spring Data JPA 3.5.13 afectado. El query nativo de outbox usa Pageable constante; orden HTTP se allowlistea.	Confirmar callers/config; aceptar residual o planificar major upgrade. No hay fix 3.5 OSS confirmado.
CVE-2026-47860	Spring AMQP 3.2.12 afectado. Consumer externo deshabilitado por defecto; no se encontro configuracion de descompresion. ACL de broker no verificada.	Seguridad/DevOps deben revisar ACL y entorno; aceptar residual o migrar.

Fuentes primarias: 47890, 47884, 47834, 47860. Severidades del proveedor; discrepancias OSV/GHSA conservadas.
Versiones: Spring Boot 3.5.16, Framework/WebMVC 6.2.19, Data JPA 3.5.13, AMQP 3.2.12 y Security 6.5.11. Los CVE 2025-41248/41249 estan resueltos por versiones OSS actuales; los cuatro 2026 permanecen en versiones afectadas. No hay aceptacion formal ni migracion Boot 4.

Controles observables

Modo DEMO acotado a DEV; migracion V29 en migration-demo y excluida de PROD. Migraciones V30/V31 fueron validadas en ambientes efimeros; no se altero la base compartida rentas. El adaptador Core HTTP queda opt-in y desactivado por defecto. Los escaneos SCA y secretos del SHA candidato pasaron. GitHub mantiene 12 alertas Dependabot en develop (5 altas, 7 moderadas); el candidato contiene versiones npm parcheadas, pero no se afirma que develop ya las haya cerrado.

M1 / Core / M9

Los contratos propuestos fueron revisados externamente, pero en este cierre no se publico un evento real desde la candidata ni existe evidencia durable de procesamiento por Ciudadanos. RabbitMQ Testcontainers PASS no equivale a recepcion del broker compartido ni ACK del consumidor M1. Identidad JWT/operacion productiva y la confirmacion eventId/requestId siguen fuera de evidencia.

No se ejecutaron llamadas reales a Core, cambios de bases de otros modulos, AWS apply ni despliegues en este cierre.

5. Release, tag y demostracion local

Estado de ambientes y promocion

Ambiente	Estado / evidencia
AWS DEV	Ultimo run exitoso conocido: 41847248991 sobre develop a3827528. No es un deploy del candidato.
AWS TEST	No se verifico una promocion del SHA candidato a TEST.
AWS PROD / main	main permanece en c3b3d659. No hubo promocion autorizada del candidato; un push a main activa el pipeline productivo.
Tag	v1.0-testing no existe y no fue creado.

Por que no corresponde etiquetar ahora

El commit candidato aun no esta integrado a develop; falta revision/merge del PR #104, decision de Seguridad para los cuatro riesgos, revision de issues Under Review y autorizacion de DevOps para la promocion develop a main. Tambien faltaria ejecutar PIT, estabilidad y no funcionales sobre el commit liberable exacto en main, y comprobar operabilidad del perfil PROD/login definitivo. Crear el tag ahora apuntaria a un commit no promovido y omitiria controles obligatorios.

Instrucciones reproducibles para revisar la candidata

Clon limpio de lectura (no despliega ni conecta a Core):
git clone https://github.com/DAI2-Modulo-de-rentas-deudas-y-tributos/Modulo-5.git
cd Modulo-5
git fetch origin
git switch --detach f7143c5b537d766d70acce1403ec6ff1f7f654c6
instalar Java 17 y Docker Desktop; revisar .env.example antes de crear un .env
docker compose config
docker compose up --build

Para una demostracion local, usar datos sinteticos y el perfil DEMO configurado por Compose; crear cuentas separadas RENTAS, SUPERVISOR, CASHIER y TAXPAYER. No reutilizar contrasenas personales ni agregar .env al Git. La autentificacion DEMO no representa JWT/Core productivo. Consultar Guia de exposicion y seguridad y runbook de secretos por ambiente.

Evidencia durable y limites

CI ordinario exacto: 41976414904. Estabilidad: 41983049050. No funcionales: 41983717483. PIT: 41977086708. Los artifacts de GitHub tienen retencion finita. Las capturas/PDF de acceptance usan datos sinteticos; no se adjuntan credenciales, tokens ni datos personales reales.

Resultado global: candidato tecnicamente probado y listo para revision humana, pero NO aprobado para merge final, despliegue PROD ni tag. Los pendientes externos y Jira se mantienen visibles; ninguna evidencia simulada se presenta como interoperabilidad real.
